


北京市技术开发区档案复印
北京市技术开发区档案复印
2005.11.15

北京市建设项目
环境保护设施竣工
验收审批表
(大中型项目)




建设单位 北京可口可乐饮料有限公司新厂筹建处 项目名称 北京可乐新厂
建设地点 崇京东街9号 项目负责人 覃业龙
填写日期 1999年2月26 联系电话 65268888-1526

说 明

1. 此验收证书是根据市政府颁发的〔京政发（1988）15号〕文件《北京市实施〈建设项目环境保护管理办法〉细则》的规定制定的。
2. 建设单位应在建设项目正式验收前的一个月将此验收证书按要求填好报环保部门审查。
3. 未经验收或验收不合格的建设项目不得投入使用，凡擅自投产使用的项目由环保部门令其停止使用或限期改进，补办手续并处以罚款。
4. 验收监测工作应由经环保部门认可的监测单位担任，监测报告单应附在本证书后面做为附件。
5. 验收合格后的建设项目，由区、县环保部门按照北京市环保法规进行日常监督管理。
6. 本证书一式四份，经环保部门审查盖章后生效，二份报送环保部门一份报主管上级，一份本单位存档。本证书由北京市环保局统一编制，自1988年10月起施行。

建 设 项 目 总 投 资 (万 元)	2995 万 美 元	环 保 投 资 (万 元)	50 万 美 元
建 筑 面 积 (M ²)	56105	环 保 设 施 设 计 单 位	化 工 部 第 二 设 计 院 欧 业 科 技 有 限 公 司
环 境 影 响 报 告 表 (书) 审 批 日 期	1997 年 2 月 20 日	开 工 日 期	1997 年 4 月 15
竣 工 日 期	1998 年 6 月 25 日	试 生 产 日 期	98 年 9 月 27 日
建 设 项 目 设 计 生 产 能 力	Can 线 10 万 吨 / 年 PET 线 10 万 吨 / 年	验 收 时 实 际 生 产 能 力	Can 线 10 万 吨 / 年 PET 线 10 万 吨 / 年
占 有 地 面 积	70095.8	绿 地 面 积	21629
扩 初 设 计 环 保 问 题 摘 要:	在 饮 料 生 产 过 程 中 有 大 量 废 水 排 出, 其 中 主 要 污 染 物 是 制 造 饮 料 的 物 料, 对 此 废 水 进 行 有 效 治 理 后 再 进 行 排 放。		

绘出生产工艺流程平面布置图,注明三废排放点,标出监测点的位置

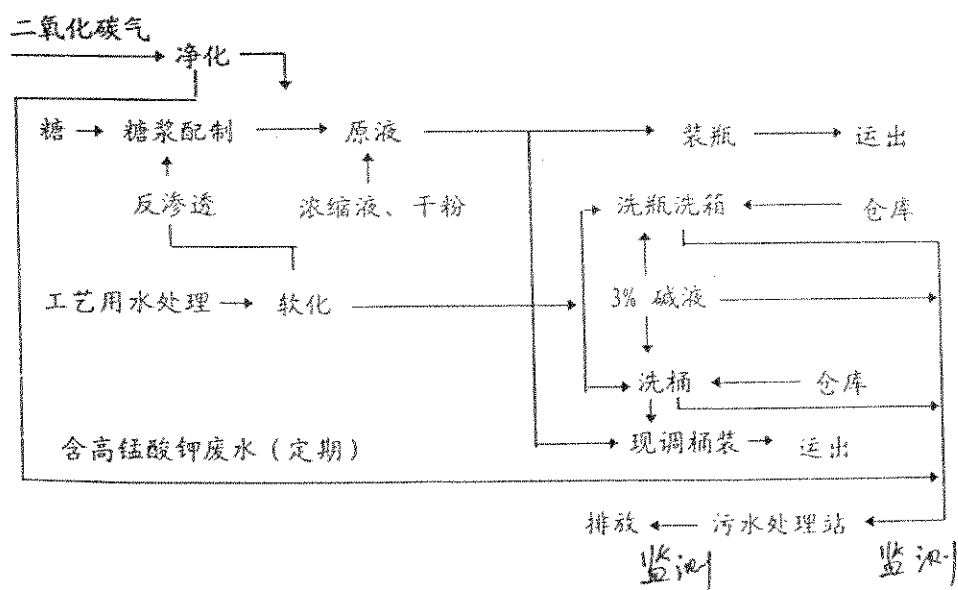

简要说明扩初设计中环保问题的实施情况及存在的问题

本公司生产各种类型的可口可乐饮品。生产过程中的污染源及治理情况如下：

1. 废水。

废水是本厂的主要污染物。来源是生产废水及生活废水中的主要成分为有机物。本厂污水处理系统采用了厌氧组合生物化学处理技术工艺。设计能力为：2000m³。经过试运行，处理后的最终排水水质达到《北京市排入市下水道水污染物排放标准》的(A)级标准。

2. 噪声

噪声源主要为生产线设备运行产生的噪声，空调机，空压机房，新风机组，污水处理鼓风机等。对这些声源设计中采用单独房间予以隔离，从而使环境的噪声在允许的范围之内。

生产装置名称	废水名称	排放量 T/日	废水成分	治理方法 (投资、面积)	处理能力 T/日			监测结果	排放去向 执行标准	备注	
					设计	实际					
废	Can 线	513	BOD ₅ : 1350mg/l	生产废水 去污水处理				PH: 7.17-7.70	开发区		
	PET 线	412	COD _{Cr} : 2000mg/l	去污水处理	2000	1000	COD _{Cr} : 34	废水管			
		生活废水	55	TSS: 215mg/l	去污水处理			BOD ₅ : 5	网		
水				新建污水处理 处理方法				SS: 19	污水处理站		
				投资约50万欧元, 面积1500m ²					排放标准 按准A16		

[illegible]

	固 体 废 弃 物		合 利 用 方 法 、 数 量	安 全 处 置 办 法 、 数 量	投 资	备 注
	名 称	数 量 T/年				
废 渣	生产废物	103	全部废品回收			

	其它污染物名称	排 放 量	治 理 方 法	监 测 结 果	执 行 标 准	备 注

主管单位(局、总公司)环保部门审查意见:

市、区、县环保部门审批意见:

同意验收, 按规定交纳超标
排污费.

